

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยลึกตอนบน หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยลึกอินทรมิตร ตำบลชุมภูพร
กว้าง ๑๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยลึกตอนบน หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยลึกอินทรมิตร ตำบลชุมภูพร
กว้าง ๑๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เป็นเงินจำนวน ๕๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

กำหนดแล้วเสร็จ ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวนวลจันทร์ ไชยรบ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ชุมภูพร	ประธานกรรมการ
๖.๒ พ.จ.อ.อนวัช บุญบุรมย์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายปิยพงษ์ สว่างแสน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๔ นางสาวสุกัญญา มาจันทร์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ห้วยลึกตอนบน

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรมิตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 1.50 ม.ผนังข้างสูง 3.00 ม.กว้าง 10.00 ม.

ประมาณการราคาโดย

ประมาณการวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่างานต้นทุน(บาท)		ราคากลาง		
1	ก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 10.00 ม.	1	แห่ง	383,921.66	383,921.66	1.3716	526,586.96	526,586.96	
				รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	383,921.66		526,586.96	526,000.00	

ราคาปรับพิเศษเป็น

ราคาปรับลดเฉพาะเป็น

ผู้ประมาณราคา ลงชื่อ.....

(นายนิยมพงษ์ สว่างแสน)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาววลลันทร ไชยรบ)

พ.จ.อ.กรรมการ

(อนวัช มฤยมย์)

ตัวหนังสือ

(ห้ามเสนอของหมิ่นกษัตริย์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มาจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิยมพงษ์ สว่างแสน)



ประมาณการฝายน้ำล้น (ท 4-01)

รายการประมาณการก่อสร้างฝายแบบ มข.2527 สันฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3.00 ม. กว้าง 10.00 ม.

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 ห้วยลึกตอนบน

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรมิตร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

ปริมาณงาน ขนาดสันฝายสูง 1.50 ม.ผนังข้างสูง 3.00 ม.กว้าง 10.00 ม.

ประมาณการราคาโดย ประมาณการวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน เป็นเงิน	หน่วยเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
1	งานดินชุดและดินถมด้วยเครื่องจักร	งาน	1		-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2	ปูนซีเมนต์	ถุง	520	123.83	64,391.60	-	-	64,391.60	
3	ทราย	ลบ.ม	55	280.37	15,420.35	-	-	15,420.35	
4	หินกรวด	ลบ.ม	82	747.66	61,308.12	-	-	61,308.12	
5	ค่าแรงงาน	ลบ.ม	82	-	-	498.00	40,836.00	40,836.00	
6	เหล็กเส้นกลม Dia 6 มม	กก.	45	29.26	1,316.58	4.10	184.50	1,501.08	
7	เหล็กเส้นกลม Dia 12 มม	กก.	4,440	16.84	74,774.57	3.30	14,652.00	89,426.57	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก	70	84.11	5,887.70	-	-	5,887.70	
9	ตะปู 3 นิ้ว	กก	36	46.73	1,682.28	-	-	1,682.28	
10	ไม้ 1 1/2"x6"x3.50 ม.	ลบ.ฟ	33	592.52	19,553.16	-	-	19,553.16	
11	ไม้ 1"x8"x4.00 ม.	ลบ.ฟ	30	257.01	7,710.30	-	-	7,710.30	
12	ไม้ 1 1/2"x3"x4.00 ม.	ลบ.ฟ	25	592.52	14,813.00	-	-	14,813.00	
13	หินใหญ่	ลบ.ม	14	560.75	7,850.50	-	-	7,850.50	
14	ไม้อัด 10 มม.	แผ่น	30	399.00	11,970.00	-	-	11,970.00	
15	ไม้แบบ	ตร.ม	87		-	133.00	11,571.00	11,571.00	
								383,921.66	



โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.27 (ห้วยลึกตอนบน)

หน้า 10 ปลายลูกอินทนิมิต

ของอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2565

ตำบลชุมพล
อำเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี



แบบมาตรฐานก่อสร้าง

ฝายน้ำล้น มข. 2527

ประกอบกิจการดำเนินงานโครงการลงทุนเพื่อสังคม

(SOCIAL INVESTMENT PROJECT - SIP)

กองวิชาการและแผนงาน

กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

Division of Technical Services and Planning, The Department of Local Administration

Ministry of Interior



คำนำ

จากปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะการจ้างงาน ซึ่งจากการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ว่างงาน และผู้ถูกเลิกจ้างเนื่องจากการว่างงานในปี 2541 ประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักในเรื่อสิ่งนี้เป็นอย่างดี และเห็นว่าจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร็วจึงได้พิจารณา ขอบุติจาจากธนาคารโลกและรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อนำมาซึ่งแก้ปัญหาสังคมแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการว่างงานเศรษฐกิจ โดยจัดทำโครงการเงินกู้ภายใต้ชื่อ "โครงการลงทุนเพื่อสังคม (Social Investment Project)"

กรมการปกครองได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมในโครงการลงทุนเพื่อสังคม โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดเล็กตามแบบมาตรฐาน มข. 2527 เป็นหนึ่งในโครงการที่ กรมการปกครองรับผิดชอบ ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการว่างงานแล้วยังเป็นการเพิ่มแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งเป็นที่จับพื้นที่ฐานในการผลิต ของประชาชนในชนบทได้อีกทางหนึ่งด้วย อันจะมีส่วนในการพัฒนาความมั่นคงและภาวะสงบสุขของประชาชนให้ดีขึ้นในระยะยาว

ในเอกสารแบบมาตรฐานก่อสร้างฉบับนี้ ประกอบด้วยสองส่วน คือ แบบการก่อสร้าง และรายการประมาณการก่อสร้าง ซึ่งผู้ดำเนินการจัดจ้าง จะใช้เป็นแบบในการ ดำเนินการจัดจ้าง และเป็นการประกอบสัญญาการจัดจ้าง โดยแบบการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานปริมาณและส่วนขยายภาพประมาณการ ก่อสร้างนั้น เป็นแนวทางในการเสนอราคาของผู้รับจ้าง ซึ่งหากมีการสำรวจในพื้นที่จริงแล้ว มีขนาดของฝายที่ไม่ตรงกับขนาดที่ระบุตามรายการประมาณการก่อสร้างนี้ ผู้ประมาณราคาก็สามารถจัดทำรายการประมาณการขึ้นใหม่โดยใช้รูปแบบการประมาณการในเอกสารนี้ แต่ปรับรายละเอียดงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการ ดำเนินงานได้

กรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ธนาคารโลก กระทรวงการคลัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานโครงการจะเป็นไปอย่างราบรื่นได้ด้วยความโปร่งใส สุจริต มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในประชาชน ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

ณ วันที่ ๒๕๔๑




- [illegible]

ศูนย์สอนภาษาอังกฤษ


ชื่อนักเรียน

- 1971年

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

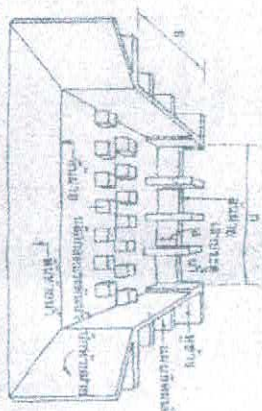

25.27

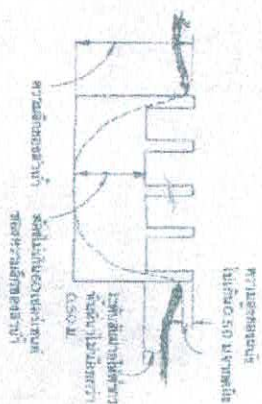


CONTRACTS WITH SUBSIDIARIES

จำนวนคน	จำนวนคนต่อหน่วย	จำนวนคนต่อหน่วย (ค่าเฉลี่ย)
6	3	11
7	3	13
8	4	15
9	5	17
10	5	19
11	6	21
12	7	23
13	7	25
14	8	27
15	8	29
16	9	31
17	10	33
18	11	35
19	11	37
20	11	39



สาขาที่ 1 จำนวนตามประจักษ์ และจำนวนที่เป็นทศนิยม

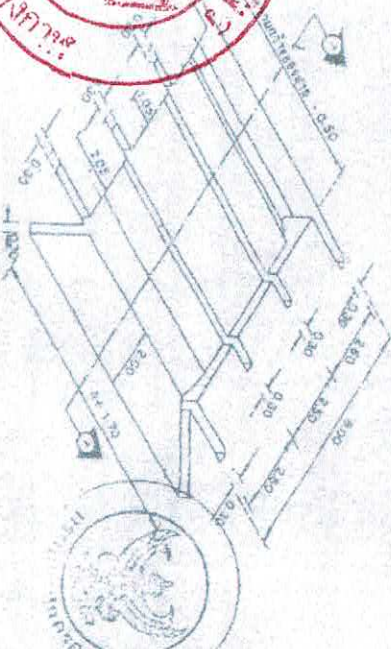

ကမ္ဘာ့အသံကဏ္ဍ
အသံကဏ္ဍ

[illegible]

— 47 —

ผู้รับ	คุณ นพพร
--------	----------

மதுரை மதுரை

80. 7139 2

24

המחלקה הכלכלית

№	№
10063	10063

11/11/15 11:11 AM

1978
1979

2.6) *kermit*

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

1720.


8 D R 37

11/12/25

91.4-01

ขั้นตอนที่ 2


- ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม

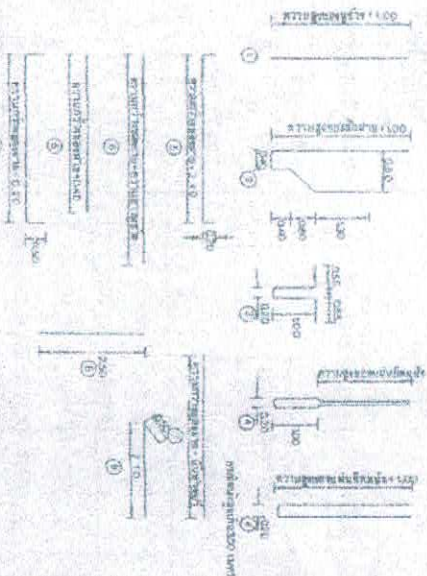

รูปแบบการตัดถนน

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบรายละเอียด

1. เสร็จสิ้นการก่อสร้างถนน
2. เสร็จสิ้นการก่อสร้างถนน
3. การตรวจสอบการก่อสร้างถนน




รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบรายละเอียด

2

ตารางที่ 2 ตารางพื้นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ขนาดกว้าง (เมตร)	พื้นที่ภายใน (ตารางเมตร)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	56	31	66	40	24	10	11	21	10
7	66	36	76	40	24	10	11	36	10
8	66	41	86	40	24	10	11	41	10
9	66	46	96	40	24	10	11	46	10
10	66	51	106	40	24	10	11	51	10
11	66	56	116	40	24	10	11	56	10
12	66	61	126	40	24	10	11	61	10
13	66	66	136	40	24	10	11	66	10
14	66	71	146	40	24	10	11	71	10
15	66	76	156	40	24	10	11	76	10
16	66	81	166	40	24	10	11	81	10
17	66	86	176	40	24	10	11	86	10
18	66	91	186	40	24	10	11	91	10
19	66	96	196	40	24	10	11	96	10
20	66	101	206	40	24	10	11	101	10

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบรายละเอียด



กรมการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...

นาย...



นาย...

นาย...


91.4-01

ขั้นตอนที่ 3

- กำหนดพื้นที่งานและพื้นที่
- เสร็จเรียบร้อยแล้ว

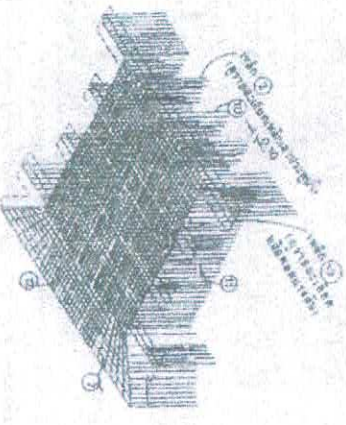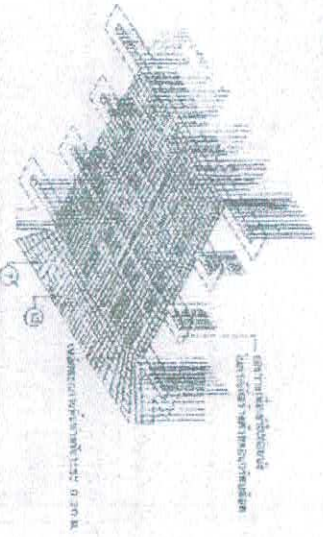

พื้นที่ว่างที่เหลือใช้ปลูกต้นไม้



ลำดับ	พื้นที่ว่าง	พื้นที่ปลูก	พื้นที่ก่อสร้าง	พื้นที่ว่าง	พื้นที่ปลูก	พื้นที่ก่อสร้าง
1	40	40	31	80	9	44
2	40	40	38	80	9	52
3	40	40	41	80	12	60
4	40	40	46	80	15	68
5	40	40	51	80	18	76
6	40	40	56	80	21	84
7	40	40	61	80	24	92
8	40	40	66	80	27	100
9	40	40	71	80	30	108
10	40	40	76	80	33	116
11	40	40	81	80	36	124
12	40	40	86	80	39	132
13	40	40	91	80	42	140
14	40	40	96	80	45	148
15	40	40	101	80	48	156

ตารางที่ 3 พื้นที่ปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่างที่เหลือใช้ปลูกต้นไม้



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

แบบมาตรฐาน

- 4 ปี

พื้นที่ว่างที่เหลือใช้ปลูกต้นไม้

นายสุชาติ นาม

นายสุชาติ นาม

นายสุชาติ นาม

นายสุชาติ นาม

นายสุชาติ นาม

นายสุชาติ นาม

นายสุชาติ นาม

นายสุชาติ นาม

นายสุชาติ นาม



นายสุชาติ นาม

น. 4-01

ขั้นตอนที่ 4

๑. สืบค้นข้อมูล

สำหรับโครงการพัฒนา

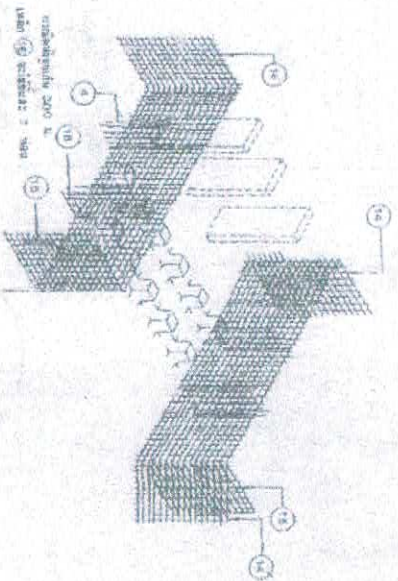

ขั้นตอนที่ 5

๑. ตรวจสอบวัสดุและราคา

การประมาณราคาวัสดุ จะต้องมีข้อมูล ดังนี้

- จำนวนวัสดุที่ใช้ : ระบุชื่อ ปริมาณ และ หน่วยวัด




- ราคาวัสดุ : ระบุราคาต่อหน่วย

- ค่าขนส่ง : ระบุค่าขนส่งจากแหล่งผลิตถึงสถานที่ก่อสร้าง

- ค่าติดตั้ง : ระบุค่าติดตั้งวัสดุ

สำหรับโครงการพัฒนา

จำนวนวัสดุ (ม.ท.)	จำนวนวัสดุ (ม.ท.)	จำนวนวัสดุ (ม.ท.)
2.00	10	20
2.50	13	26
3.00	15	30
3.50	18	36



วัสดุ	ปริมาณ	ราคา	รวม
เหล็กเส้น	1.4	1.4	1.96
เหล็กเส้น	1.4	1.4	1.96
เหล็กเส้น	1.4	1.4	1.96
เหล็กเส้น	1.4	1.4	1.96
เหล็กเส้น	1.4	1.4	1.96
เหล็กเส้น	1.4	1.4	1.96
เหล็กเส้น	1.4	1.4	1.96
เหล็กเส้น	1.4	1.4	1.96
เหล็กเส้น	1.4	1.4	1.96
เหล็กเส้น	1.4	1.4	1.96

๑. ตรวจสอบวัสดุและราคา

การประมาณราคาวัสดุ จะต้องมีข้อมูล ดังนี้

- จำนวนวัสดุที่ใช้ : ระบุชื่อ ปริมาณ และ หน่วยวัด
- ราคาวัสดุ : ระบุราคาต่อหน่วย
- ค่าขนส่ง : ระบุค่าขนส่งจากแหล่งผลิตถึงสถานที่ก่อสร้าง
- ค่าติดตั้ง : ระบุค่าติดตั้งวัสดุ

สำหรับโครงการพัฒนา



กรมการศึกษานอกโรงเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

ฝ่ายวิชาการ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

นายวิชาญ วิชาญ

91.4-01


บทที่ 6

- [illegible]



10

Figure 1. The effect of the concentration of the Fe^{2+} on the adsorption of Cu^{2+} by the Fe^{2+} -modified bentonite. The concentration of the Cu^{2+} was 100 mg/L, the pH was 5.0, the adsorption time was 24 h, and the temperature was 25 °C.

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

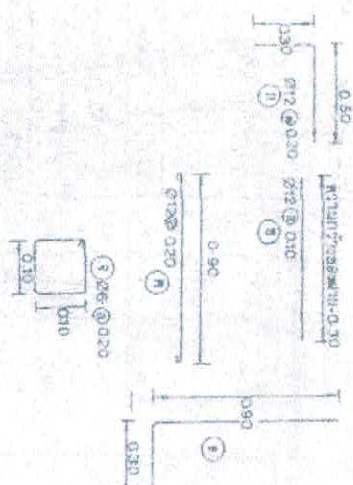

Klasifikasi Kandungan (gram)	Kandungan Log (% kandungan)					Kandungan Log (%)
	n	g	n	g	g	
6	25	10	31	20	23	74
7	25	10	36	20	25	85
8	30	10	41	24	30	97
9	35	10	46	26	35	109
10	35	10	51	28	35	120
11	40	10	56	32	40	132
12	45	10	61	36	45	143
13	45	10	66	36	45	155
14	50	10	71	40	50	166
15	50	10	76	40	50	177
16	55	10	81	44	55	189
17	60	10	86	52	60	201
18	65	10	91	52	65	213
19	65	10	96	52	65	224
20	65	10	101	52	65	235

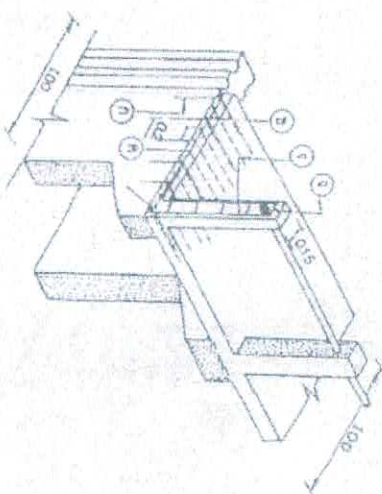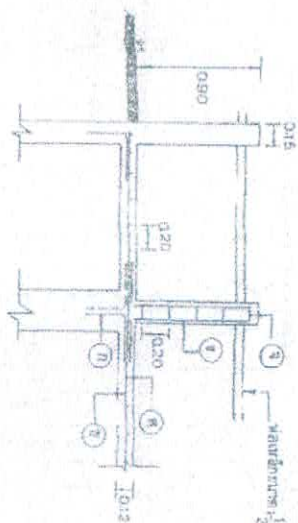

10. 11. 2014

RECEIVED

- [illegible]

[illegible]

D. Karmali

1. $\mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n) \cap \mathcal{H}^2(\mathbb{R}^n) = \mathcal{H}^2(\mathbb{R}^n)$ (Sobolev Embedding)

การดำเนินงานตามโครงการวิจัยครั้งนี้ ได้ดำเนินการใน 3 ขั้นตอน ดังนี้

2. ความรู้เกี่ยวกับความหมายของ
"ความผิดฐานฉ้อโกง" และ "ความผิดฐาน
ฉ้อโกง" และ "ความผิดฐานฉ้อโกง" และ "ความผิดฐานฉ้อโกง"

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

၁၀။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ။

9-1005 WILSON

4. คณะกรรมาธิการมีมติว่าขอเสนอให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ในนามของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และขอเสนอให้ไปนำ มาประชาสัมพันธ์กับสถานศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนในต่างประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่ โดย ข้าราชการประจำสถานศึกษาเหล่านั้นช่วยกัน



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

www.elsevier.com/locate/jmb

— $\frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} \ln \frac{1}{1 - \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2}}$

Unit	Year
1	2000
2	2001
3	2002
4	2003
5	2004
6	2005
7	2006
8	2007
9	2008
10	2009
11	2010
12	2011
13	2012
14	2013
15	2014
16	2015
17	2016
18	2017
19	2018
20	2019
21	2020
22	2021
23	2022
24	2023
25	2024
26	2025
27	2026
28	2027
29	2028
30	2029
31	2030
32	2031
33	2032
34	2033
35	2034
36	2035
37	2036
38	2037
39	2038
40	2039
41	2040
42	2041
43	2042
44	2043
45	2044
46	2045
47	2046
48	2047
49	2048
50	2049
51	2050
52	2051
53	2052
54	2053
55	2054
56	2055
57	2056
58	2057
59	2058
60	2059
61	2060
62	2061
63	2062
64	2063
65	2064
66	2065
67	2066
68	2067
69	2068
70	2069
71	2070
72	2071
73	2072
74	2073
75	2074
76	2075
77	2076
78	2077
79	2078
80	2079
81	2080
82	2081
83	2082
84	2083
85	2084
86	2085
87	2086
88	2087
89	2088
90	2089
91	2090
92	2091
93	2092
94	2093
95	2094
96	2095
97	2096
98	2097
99	2098
100	2099
101	2100
102	2101
103	2102
104	2103
105	2104
106	2105
107	2106
108	2107
109	2108
110	2109
111	2110
112	2111
113	2112
114	2113
115	2114
116	2115
117	2116
118	2117
119	2118
120	2119
121	2120
122	2121
123	2122
124	2123
125	2124
126	2125
127	2126
128	2127
129	2128
130	2129
131	2130
132	2131
133	2132
134	2133
135	2134
136	2135
137	2136
138	2137
139	2138
140	2139
141	2140
142	2141
143	2142
144	2143
145	2144
146	2145
147	2146
148	2147
149	2148
150	2149
151	2150
152	2151
153	2152
154	2153
155	2154
156	2155
157	2156
158	2157
159	2158
160	2159
16	

พ.ร.บ. ๒๕๖๒ พ.ร.บ. ๒๕๖๓

2006. 11.10

[illegible]

2171-10005

2005-03-27 / Tuesday

1927

7. OK

2014年12月

RESULTS

$$\begin{array}{r} 18 \\ 57 \end{array}$$

1. **Business**

M. 4-01




[illegible]

Discounts 1.00 unit advantages 2.50 unit

[illegible]

1.00 mm 3.00 mm

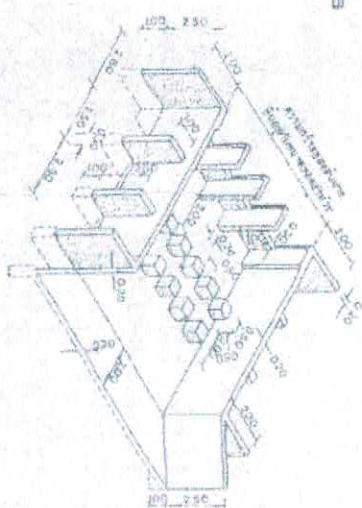


15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850.

McGraw-Hill

1874

[illegible]

Running 2.00 miles advantage 3.50 miles

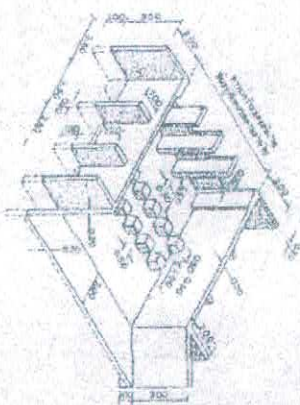[illegible]

အသံအသံအသံ

| | |
|------|---------------|
| 6079 | USGS WMACT-PT |
|------|---------------|

7210
10/10/10

| | |
|--------|---|
| 2/2/20 | 6 |
|--------|---|

CO
CA
-B
-2

ภาษาละติน

91.4--01



รายการนี้ใช้ประกอบการก่อสร้างฝาย

1. ปูนซีเมนต์

- 1.1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างจะเลือกใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1 - 2515
- 1.2 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่ออิฐและฉาบปูน ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 88 - 2511
- 1.3 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์เสื่อมคุณภาพโดยความชื้นแข็งตัวจับกันก้อน หรือไฮดรอน

2. ทราย

- 2.1 ต้องเป็นทรายแม่น้ำสีเทาอ่อน แฉะแฉ่งและสะอาดปราศจากวัสดุอื่นที่เป็น เช่น เปลือกหอย ดิน เศษหินที่ต่าง ๆ และจะต้องมีคุณสมบัติและขนาดตามที่กำหนดดังนี้

| ผ่านตะแกรง | ขนาด 3/8 นิ้ว | จำนวน | 100 % | โดยน้ำหนัก |
|------------|---------------|-------|---------|------------|
| " | 4 | " | 95-100% | " |
| " | 16 | " | 45-85% | " |
| " | 50 | " | 5-30% | " |
| " | 100 | " | 0-10% | " |

3. หินหรือกรวด

- 3.1 หิน กรวดที่ใช้ต้องแข็งแรงแรง เหนียว ไม่ผุและสภาพปราศจากวัสดุอื่นที่เป็น และจะต้องมีคุณสมบัติและขนาดตามที่กำหนดต่อไปนี้

| ขนาด | เปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงโดยน้ำหนัก | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|
| | 1.5" | 1" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | # 4 | # 6 | # 16 |
| 1.5" - # 4 | 90-100 | - | 30-70 | - | 10-30 | 0-15 | - | - |
| 1" - # 4 | 100 | 90-100 | - | 20-60 | - | 0-10 | 0-5 | - |
| 3/4" - # 4 | - | 100 | 90-100 | - | 20-60 | 0-10 | 0-5 | - |
| 1/2" - # 4 | - | - | 100 | 90-100 | 40-70 | 0-15 | 0-5 | - |
| 3/8" - # 6 | - | - | - | 100 | 80-100 | 10-30 | 0-10 | 0-5 |



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

วันที่ 3/4 ของเดือน

2
[50]

4) มีการประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง

4.2 ถ้าจำเป็นจะต้องใช้ผ้าปูที่นอนพลาสติกแบบมีตะขอยึดติดกับเตียงนอนในห้องเสียก่อน จึงจะนำมาใช้ได้โดยปลอดภัย 1 สลอร์ ต่อเตียงนอน 500 สลอร์ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

5 นาที พร้อมเอกสารที่จะถามกันหมดแล้วจึงชี้ภาพเอาฝ่ามือมาไว้ใต้

5. Primer

5.1 ท่อพลาติกโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ขนาด 15" x 15" x 15 ซม. มีเนื้อที่ภายใน 28 m และช่องระบายอากาศ 210 m³/ชม.

5.2 ในทางปฏิบัติจะใช้ข้อมูลการวัดสมมติหรือ ส่วนผสมของข้อมูลการวัดขอมให้เปลี่ยนแปลงได้บ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพที่ดี แต่ก็ไม่ควรยึดค่าเฉลี่ยของแหล่งข้อมูลมากเกินไป 15°-15'±0"

เมื่ออายุ 28 วัน ต่อกันไม่น้อยกว่า 210 กก. พบ ก่อนที่จะนำมาใช้ต้องส่งรายการจำนวนส่วนผสม และผลการวิเคราะห์ค่าแรงต่อค่าสูง ให้ผู้จ้างพิจารณาผ่านก่อน

5.3 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลน และพิจารณาว่าแบบแปลนนั้นมีความเหมาะสมและถูกต้องตามแบบ พร้อมพิจารณาและออกแบบและจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในการผลิตอุปกรณ์ประกอบแล้ว และ

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

5.4 ความหนาของคอนกรีตที่ถมเพื่อกลักรเสริมอาจมีผลต่อความกว้างของรอยร้าวได้ประมาณ 2.5 ซม. เนื่องจากฐานรากมีการขยายการปองกันแนวคดงอ คอนกรีตเสริมเหล็กมีความยาวของรอยร้าว

หน้า ๕

ผู้ว่าจ้าง คืออย่างครอบครัวที่ระงับคดีเพื่อให้ญาติมีการทวงถามคดีและช่วยทางครอบครัวละ 3 ล้านบาท เพื่อขอศาลทำคำสั่งอายัด 28 วัน

๕.๖ ในที่นี้ใช้คำว่า "บุคคลซึ่งมีอำนาจทาง" ไม่ได้อาจจะหมายถึง "ให้แก่บุคคลที่ทำหน้าที่ต่อไป"

5.7 แม้ผมจะไม่เคยคิดถึงการนำตัวเองไปใช้ทำผิดอะไรก็ตามแต่ผมก็คิดว่าผมควรจะรู้ไว้ก่อนดีกว่าที่จะไปทำผิดแล้วค่อยมาแก้ตัวทีหลัง

WILLIAM K. MCELROY

1991

1919 - 1920

7 211



[illegible]

6. เมื่อกำหนดและสร้างข้อมูลหลัก

சென்னை

พ. ๒๕๕๖/๒๕๕๗/๒๕๕๘ ตาม ส.อ.บ. 20 - 2515

๗. หนังสือแจ้งมติของศาลปกครองชั้นต้นฉบับที่ กตผ.มอ.ก. 24-2516 ลงวันที่ ๒

5.2 สำหรับหลักการที่ต้องมีคุณภาพตามรายละเอียดของมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 138-2518 และให้ใช้ส่วนต่อเติมฉบับที่ 18

เสียงหัวเราะ

புதுக்கோட்டை

ก่อนสัปดาห์ 3 วัน

8. ต่อมาเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศได้เชิญผู้แทนจากคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรมาหารือถึงข้อควรปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ซึ่งได้มีมติว่า คณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรควรพิจารณาและเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้ง

ผู้รับชำระจะส่งหลักฐานมาว่ามอบไปผานนั้นแล้วสิ้น

ก่อสร้างเสียก่อนว่าจะสามารถทำการก่อสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและให้ค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครอื่น ๆ ซึ่งเต็มใจ

ปฏิวัติที่ไทยไม่เคยมีซ้ำอีกเรียกว่าสยามเปลี่ยนมาเป็นสยามแล้วสวาทอภัยไปอีกแห่งหนึ่ง

[illegible]

14. ในกรณีผู้ปฏิบัติงาน หรือช่างก่อสร้างของมีขึ้นซึ่งทำการชั่วคราวที่ไม่ต้องผูกจ้าง การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว แต่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไข

นี่คือสิ่งที่ได้ จากการสำรวจวิจัยที่มีเป้าหมายที่จะหาข้อบกพร่องในภาพลักษณ์ของประเทศไทย โดยผู้วิจัยจะคอยสังเกตและ

อันเนื่องมาจากภาวะขาดแคลนผู้รับจ้างหัตถกรรม หรือการค้าไม่เหมาะสมกับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะพยายามแสวงหาผลประโยชน์

15. ในการใช้ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงแบบแผน จะต้องให้คณะกรรมการการจ้างหรือผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนแปลงก่อน ผู้จ้างจึงจะร่วมทำการก่อสร้างต่อไป

